Cloud-Transformation bei Meyer Industrial Solutions

Mein Ziel: verlässliche Geschäftsprozesse und eine entlastete IT

ERP stabilisieren

Ursachen und Abhängigkeiten vor der Migration prüfen

Zugriffe verbessern

Standorte und mobile Arbeit vom Hauptsitz entkoppeln

Betrieb klären

Verantwortung, Servicequalität und Kosten transparent regeln

Mein Entscheidungsweg: Fakten ordnen, Risiken priorisieren, Optionen prüfen

So habe ich die Kundensituation strukturiert

Bekannter Fakt	Meine Einordnung	Noch zu klären
ERP unterstützt zentrale Abläufe	Hohe geschäftliche Kritikalität	Ausfallwirkung und Störungsursache
Vier IT-Kräfte betreiben die IT	Entlastung braucht klare Leistungen	Aufgaben, Servicezeiten und Budget
Hauptsitz bündelt viele Zugriffe	Gemeinsame Ausfallabhängigkeit	Leitungswege und lokale Abhängigkeiten
Entwicklung/Test soll in OTC	Zielort ist bereits vorgegeben	Ressourcenbedarf und Betriebsumfang

Fakten tragen die Analyse. Offene Punkte bleiben sichtbar.

So setze ich die Prioritäten

Priorität	Warum jetzt?	Mein nächster Prüfschritt
1 ERP und Wiederherstellung	Geschäftsprozesse und Daten schützen	Störungen erfassen und Restore prüfen
2 Standortabhängigkeit	Ausfall des Hauptsitzes wirkt weit	Netzwege und alternative Zugänge messen
3 Betriebsentlastung	Vier IT-Kräfte sind stark ausgelastet	Aufgaben und Serviceumfang abgrenzen
4 Entwicklung/Test in OTC	Vorgegebener Modernisierungsschritt	Geeigneten Pilotumfang definieren

Priorisierung nach Geschäftswirkung und Dringlichkeit, mit paralleler Absicherung

So würde ich die ERP-Störungen untersuchen

1. Beobachten

Fehlerbild erfassen

Zeitpunkt, Standort, Benutzer und Arbeitsschritt

Geschäftsablauf messen

Anmeldung, Auftrag öffnen, speichern und drucken

Technische Ebenen korrelieren

Netzwerk, RDS, ERP, Datenbank und Storage

2. Hypothese prüfen

Befund statt Vermutung

Gleichzeitige Ereignisse und Lastspitzen vergleichen

Gezielt korrigieren

Maßnahme passend zum nachgewiesenen Engpass

Pilot fachlich abnehmen

Gleicher Ablauf, vergleichbare Nutzer und Last

Eine Cloud-Migration ist kein Nachweis für eine behobene ERP-Ursache.


So wähle ich den Betriebsort aus

Option	Spricht dafür	Freigabe nur wenn …
Betreute kompatible Virtualisierung	Geringere Änderung am Legacy-Verbund	Support, Lizenzen und Gesamtkosten passen
OTC-IaaS mit Managed Services	Gemeinsame Cloud-Plattform möglich	Kompatibilität und Leistung nachgewiesen sind
Lokale Stabilisierung als Übergang	Handlungsfähigkeit ohne Cloud-Freigabe	Befristeter Plan und Lifecycle abgesichert sind

ERP kurzfristig nicht als SaaS verfügbar: virtuellen Verbund erhalten.

Mein Prüfpfad: Eignung bestätigen, Alternativen vergleichen, dann entscheiden

Vorläufiges Zielbild und seine Begründung

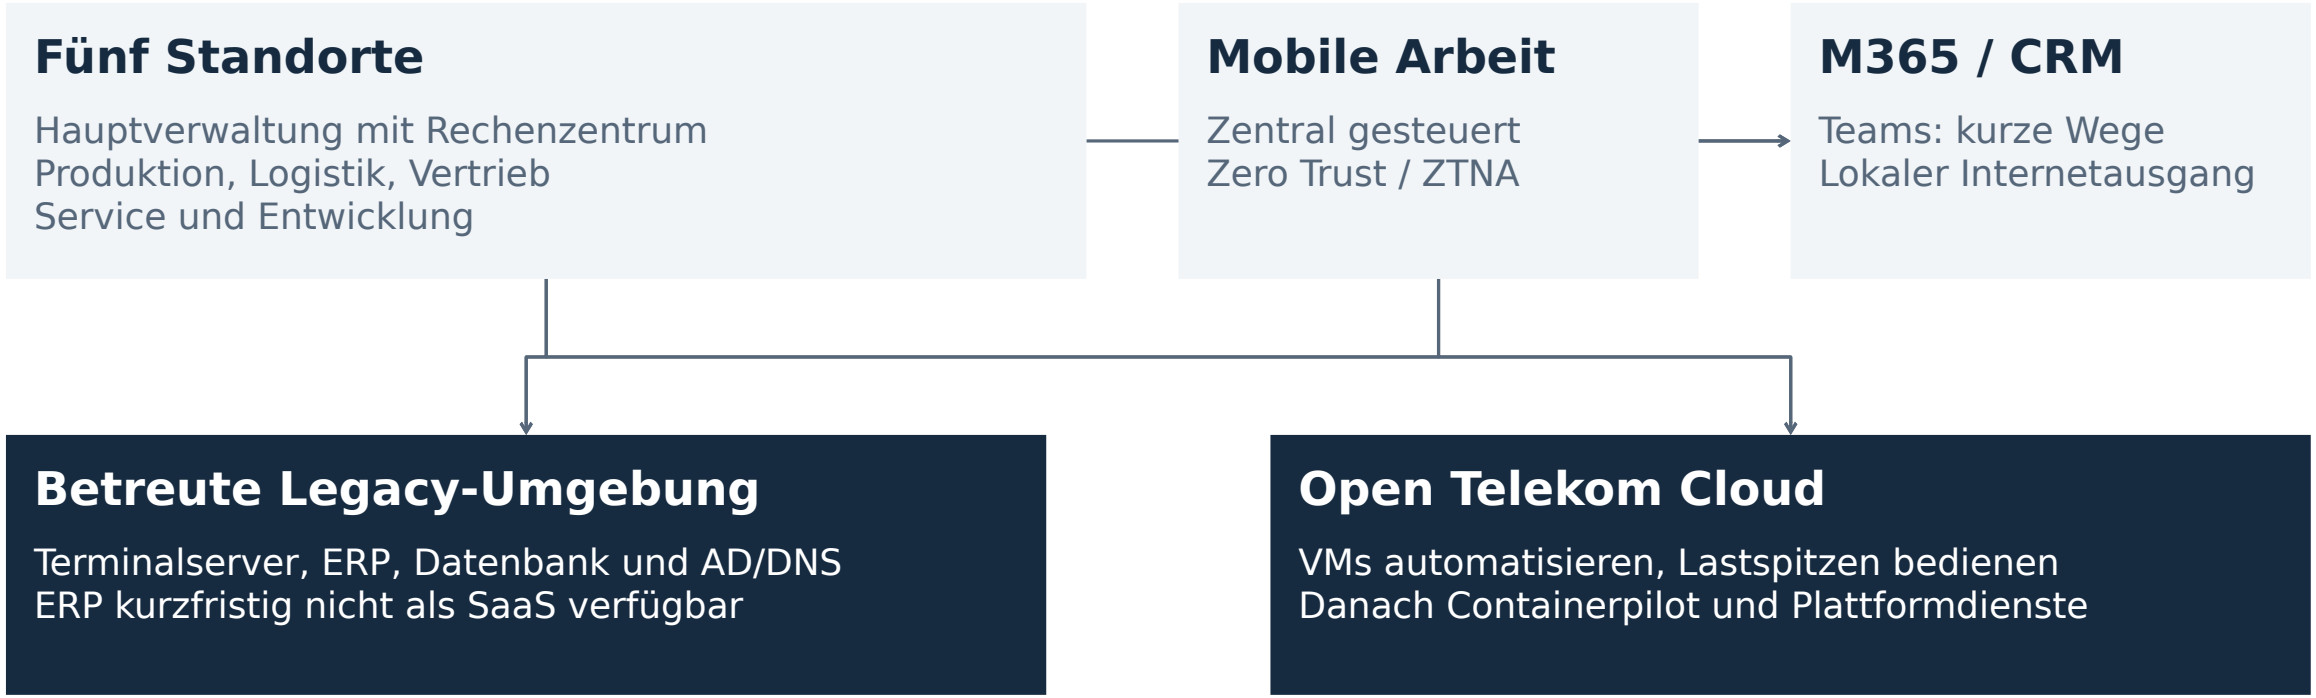

SD-WAN / SASE, Identitäten, EDR, Monitoring und getesteter Wiederanlauf

OTC: variable Auslastung flexibel bedienen und Laufzeiten gezielt steuern

So sichere ich Zugriff und Wiederanlauf ab

Zero Trust und SASE als Ziel

Identität und Gerät prüfen

MFA, Gerätezustand und minimale Rechte

Zentral gesteuerter Zugang

ZTNA statt breitem Firmen-VPN, in Wellen

Geräteschutz mit EDR

Angriffe erkennen und betreut darauf reagieren

Wiederanlauf nachweisen

Geschäftliche Ziele vereinbaren

RTO: Ausfallzeit. RPO: tolerierter Datenverlust.

Sicherungen getrennt schützen

Passende Plattformunterstützung und Administration

Vollständigen Restore testen

Identität, ERP und Testauftrag fachlich abnehmen

RTO und RPO sind noch offen. Verbindliche Werte brauchen eine Kundenentscheidung.

So würde ich die Migration steuern

Schritt	Was ich prüfen lasse	Freigabe für den nächsten Schritt
1 Assessment und Grundlage	Abhängigkeiten, Support, Messwerte und Sicherung	Zielvariante und Pilotumfang bestätigt
2 Pilot	Performance, Zugang und Wiederherstellung	Technische und fachliche Abnahme
3 Migrationswellen	Konsistenter Datenstand und Geschäftsabläufe	Benannte Entscheidung über Go / No-Go
4 Übergabe	Runbooks, Service Desk und Verantwortlichkeiten	Regelbetrieb übernimmt dokumentiert

Nach neuen Buchungen braucht ein Rückfall einen geregelten Datenabgleich.

So mache ich die IT-Entlastung überprüfbar

Kunde	Dienstleister	ERP- / Softwarepartner
Geschäftsziele und Prioritäten	Beauftragten Betrieb überwachen	Anwendung und Supportfähigkeit bestätigen
Rollen und Änderungen genehmigen	Patches, Backup und Restore durchführen	Anwendungsfehler und Datenbankthemen bearbeiten
Geschäftsabläufe fachlich abnehmen	Service Desk und Eskalation koordinieren	Kompatible Updates und Migration unterstützen

Monatlicher Nachweis: Verfügbarkeit, ERP-Abläufe, Restore, Routineaufwand und Kosten

Cloud entlastet die IT erst, wenn konkrete Betriebsaufgaben übernommen werden.

So begründe ich Investition und nächsten Schritt

Vergleichbar rechnen

Lokale Erneuerung als Alternative

Gleicher Leistungsumfang und Betrachtungszeitraum

Gesamtkosten erfassen

Betrieb, Lizenzen, Migration, Parallelbetrieb und Exit

Unsicherheit sichtbar machen

Verbrauchsszenarien statt unbelegter Einsparung

Entscheidung vorbereiten

Assessment klar anbieten

Umfang, Preis, Ergebnisse und Verantwortliche

Pilot mit Abnahmekriterien

Hersteller, Leistung, Restore und Geschäftsabläufe

Danach verbindlich kalkulieren

Zielplattform, Umsetzungsplan und Betriebsvertrag

Jetzt Assessment und Pilot qualifizieren. Die Gesamtinvestition folgt auf Nachweise.

Management Summary: meine Empfehlung

Geschäftliches Ziel	Meine Empfehlung	Erfolg wird erkennbar an …
ERP-Arbeitsfähigkeit verbessern	Ursachen prüfen und passenden Betrieb wählen	Fachlich gemessenen Geschäftsabläufen
Standortabhängigkeit reduzieren	Direkte, abgesicherte Zugriffswege	Geprüfter Erreichbarkeit und Umschaltung
IT dauerhaft entlasten	Definierte Managed Services vereinbaren	Weniger Routineaufwand und klaren Zuständigkeiten

Empfehlung unter Vorbehalt von Herstellerfreigabe, Messwerten und Kostenprüfung

Management Summary: die nächste Entscheidung

1 Assessment vereinbaren

Inventar, Ursachenbewertung, Herstellerklärung, Zielvarianten und Kostenrahmen

2 Kritische Annahmen im Pilot prüfen

Geschäftsabläufe, Performance, sichere Zugriffe und vollständiger Wiederanlauf

Erst danach: Zielplattform, Gesamtinvestition und Migrationsauftrag freigeben

Alle zehn Kundenziele sind zugeordnet

Ziel	Kundenziel	Zugeordnete Maßnahme	Folien
1	ERP-Verfügbarkeit verbessern	Ursachenanalyse, geeigneter Betrieb, Restore	4-8
2	Performance für Standorte / Außendienst	Messbaseline, direkte Wege, ERP-Pilot	4, 6-8
3	Hauptstandort-Abhängigkeit reduzieren	Direkte Cloud-/SaaS-Pfade, AD/DNS absichern	6-8
4	Interne IT entlasten	Managed Services und definierte Eskalationen	9
5	Netzwerkarchitektur modernisieren	Betreutes SD-WAN und SASE-Zielbild	6-7
6	Cloud und SaaS sicher direkt nutzen	Zero Trust, ZTNA, EDR, lokale SaaS-Ausgänge	6-7
7	OTC für Entwicklung / Cloud-native	Automatisierte VMs, Containerpilot, Plattformdienste	6, 14
8	Infrastrukturbetrieb sicherstellen	Serviceumfang, Patches, Monitoring und Restore	7-9
9	Unterbrechungsarm migrieren	Pilot, Wellen, Abnahme und Daten-Rückfallplan	8
10	Transparenz über Kosten und Betrieb	TCO, Kennzahlen, Rollen und Service Reviews	9-10

Reservefolie: Zielabdeckung zeigen, ohne die 20 + 5 Minuten zu verlängern

Entwicklung und Test: ein klarer Stufenplan

Heute: zeitweise Leerlauf und kurzfristiger Mehrbedarf am Entwicklungsstandort

Stufe	Umsetzung	Nachweis vor Ausbau
1 Automatisierte VMs	Vorlagen, IaC, Laufzeitpläne und Quoten	Reproduzierbarer Aufbau und Kostenkontrolle
2 Containerpilot in CCE	Geeignete Anwendung, CI/CD und Rollback	Security, Monitoring und Betrieb abgenommen
3 Weitere Plattformdienste	Objektspeicher / Datenbank nach Eignung	Kompatibilität, Datenschutz und Nutzen belegt

Bedarfsgerecht skalieren und abrechnen. Dauerhafte Kostenbestandteile mitrechnen.

Discovery: meine ersten Kundenfragen

Frage	Wofür ich die Antwort brauche
Welche Prozesse stehen bei ERP-Ausfall still?	Kritikalität und wirtschaftliche Wirkung
Welche Ausfallzeit und welcher Datenverlust sind tragbar?	Verbindliche RTO- und RPO-Ziele
Welche Hosting- und Latenzvorgaben macht der ERP-Anbieter?	Geeignete Plattformen eingrenzen
Wann, wo und nach welchen Änderungen treten Fehler auf?	Messplan und Ursachenhypothesen
Welche Maschinen-, Lager- und Druckschnittstellen bestehen?	Lokale Abhängigkeiten und Migrationsgruppen
Welche Aufgaben, Kosten und Verträge bestehen heute?	Managed-Service-Umfang und TCO
Welche M365-Sicherheitsfunktionen sind lizenziert und aktiv?	MFA, Zugriffsregeln, Geräteverwaltung und EDR

Pilot: Nachweise und Rückfallentscheidung

Prüfung	Nachweis vor Freigabe
ERP-Anmeldung und Testauftrag	Vereinbarte Antwortzeit bei repräsentativer Last
Leitungsausfall und Remote-Zugang	Erreichbarkeit und tatsächliche Umschaltzeit
ERP-Restore inklusive AD/DNS	Freigegebene RTO/RPO fachlich nachgewiesen
Schnittstellen und Druck	Produktion, Logistik und Fachbereich nehmen ab
Rückfall nach Datenänderungen	Zeitfenster, Entscheider und Datenabgleich geklärt

Abnahmewerte sind mit dem Kunden zu vereinbaren, keine erfundenen Vorgaben.

Technische Beispiele für das Assessment

Wo: Windows-PowerShell auf einem freigegebenen Kundensystem

Namensauflösung und TCP-Verbindung zum vorgesehenen Gateway

```
Resolve-DnsName gateway.intern.example
Test-NetConnection gateway.intern.example -Port 443
```

Serverinventar als Ausgangspunkt für das Assessment

```
Get-CimInstance Win32_OperatingSystem
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem
```

Platzhalter ersetzen. Diese Prüfungen bestätigen weder ERP-Ursache noch Performance.

Annahmen und fachliche Grundlagen

Offene Entscheidungen

ERP-Herstellerfreigabe und Latenzgrenzen

RTO/RPO, Betriebsumfang und Servicezeiten

Datenstandorte, Lizenzen, Mengen und Preise

Quellen und Aussagegrenzen

Kundencase und Einladung als Primärgrundlage

Microsoft-Netzempfehlungen und OTC-Dokumentation

Vollständige Fachlinks in den Sprechernotizen

Keine realen Messwerte, verbindlichen Angebote oder erreichten Verbesserungen behauptet
